


Contratacao-Obras

Bizagi Modeler

Índice

CONTRATAÇÃO-OBRAS	1
BIZAGI MODELER	1
1 CONTRATAÇÃO DE OBRAS	3
1.1 CONTRATAÇÃO DE OBRAS	4
1.1.1 Elementos do processo	4
1.1.1.1  Início	4
1.1.1.2  Receber solicitação	4
1.1.1.3  Realizar estudo técnico prévio e orçamentar	4
1.1.1.4  Direção autoriza?	4
1.1.1.5  Disponibilizar recursos	5
1.1.1.6  Elaborar a documentação para a contratação dos projetos	5
1.1.1.7  Elaborar a documentação para contratar a obra	5
1.1.1.8  Preparar documentação completa e encaminhar	5
1.1.1.9  Elaborar SEC e encaminhar	5
1.1.1.10  Abrir processo licitatório	5
1.1.1.11  Enviar contrato para FEF	5
1.1.1.12  Acompanhar o processo e realizar análises técnicas das propostas	6
1.1.1.13  Convocar a empresa vencedora e preparar início das obras	6
1.1.1.14  Acompanhar, fiscalizar e encaminhar relatórios à DGA	6
1.1.1.15  Receber a obra e realizar trâmites de conclusão	6
1.1.1.16  Encaminhar documentos à DGA	6
1.1.1.17  Fim	6
1.1.1.18  Fim	6
1.1.1.19  Infraestrutura	7
1.1.1.20  Setor de Engenharia	7
1.1.1.21  DGA	7
1.1.1.22  Fase de demanda	7
1.1.1.23  Fase de execução	7
1.1.1.24  Fase de entrega	7

1 CONTRATAÇÃO DE OBRAS

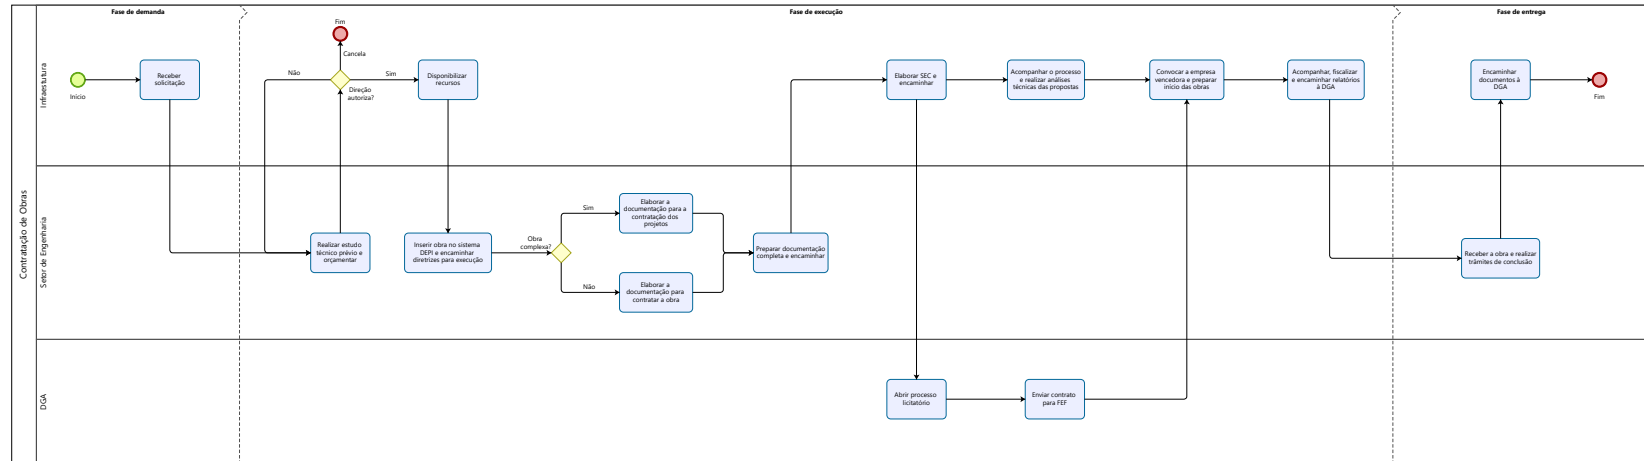

Descrição

O fluxograma resume as atividades envolvidas no processo de contratação de obras pela perspectiva do Departamento de Infraestrutura da FEF.

Versão:

1.0

Autor:

victor

1.1 CONTRATAÇÃO DE OBRAS

Descrição

Participantes e suas atividades no processo de contratação de obras.

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Início

Descrição

Processo inicia com solicitação da Diretoria da FEF.

1.1.1.2 Receber solicitação

Descrição

A Infraestrutura recebe a solicitação da diretoria da FEF com o programa de necessidades do que será executado.

1.1.1.3 Realizar estudo técnico prévio e orçamentar

Descrição

O setor de engenharia faz um estudo técnico preliminar, apresenta as opções e os custos estimativos do projeto e obra para atender a demanda.

1.1.1.4 Direção autoriza?

Descrição

Condicional de autorização da diretoria.

Portões

Sim

Não

Cancela

1.1.1.5 ☐ Disponibilizar recursos

Descrição

A direção autoriza e aponta o recurso para execução da obra.

1.1.1.6 ☐ Elaborar a documentação para a contratação dos projetos

Descrição

Elaborar a documentação técnica para a contratação dos projetos

1.1.1.7 ☐ Elaborar a documentação para contratar a obra

Descrição

Elaborar a documentação técnica para contratar a obra.

1.1.1.8 ☐ Preparar documentação completa e encaminhar

Descrição

Prepara para encaminhamento toda documentação licitatória (TR, ETP, Mapa de Risco, Eventograma) e as demais documentações técnicas (projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária), visando à licitação da obra.

1.1.1.9 ☐ Elaborar SEC e encaminhar

Descrição

Elaborar a SEC e faz o encaminhamento à DGA.

1.1.1.10 ☐ Abrir processo licitatório

Descrição

A DGA abre o processo licitatório.

1.1.1.11 ☐ Enviar contrato para FEF

Descrição

Envia o contrato revisado para a FEF.

1.1.1.12 ☐ Acompanhar o processo e realizar análises técnicas das propostas

Descrição

Acompanha o processo e realiza a análise técnica das propostas comerciais durante o certame.

1.1.1.13 ☐ Convocar a empresa vencedora e preparar início das obras

Descrição

A coordenadoria de infraestrutura convoca a empresa vencedora do certame para uma reunião de início de contrato, verifica a documentação exigida no processo licitatório e traça o planejamento e cronograma para a execução da obra.

1.1.1.14 ☐ Acompanhar, fiscalizar e encaminhar relatórios à DGA

Descrição

Durante a execução da obra o fiscal (engenheiro da Infraestrutura) realiza o acompanhamento da obra, as medições e encaminha os relatórios à DGA.

1.1.1.15 ☐ Receber a obra e realizar trâmites de conclusão

Descrição

O setor de engenharia faz o recebimento provisório e depois definitivo da obra e realiza tramites de conclusão do processo.

1.1.1.16 ☐ Encaminhar documentos à DGA

Descrição

Os documentos são encaminhados à DGA para análise e contratação dos serviços.

1.1.1.17 Fim

Descrição

Fim das atividades da Infraestrutura no processo.

1.1.1.18 Fim

Descrição

Fim antecipado por indeferimento de projeto.

1.1.1.19 Infraestutura

Descrição

Departamento de Infraestrutura e respectiva administração

1.1.1.20 Setor de Engenharia

Descrição

Setor de engenharia da Infraestrutura

1.1.1.21 DGA

Descrição

Diretoria Geral de Administração

1.1.1.22 Fase de demanda

Descrição

Fase inicial de apresentação de solicitação

1.1.1.23 Fase de execução

Descrição

Fase de orçamento, preparação e execução das obras

1.1.1.24 Fase de entrega

Descrição

Fase final de entrega das obras devidamente concluídas
